



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA)**

<b>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA</b> <b>LOCALIZAÇÃO: CENTRO - MACAPARANA / PE</b> <b>EMPRESA CONTRATADA: C &amp; M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA</b> <b>RESP. TÉCN.: ENG. CIVIL GILENO DANTAS ARRUDA</b> <b>ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241091887</b> <b>RRT DE FISCALIZAÇÃO Nº 13995414</b>	<b>PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 010/2023</b> <b>CONVITE: Nº 003/2023</b> <b>CONTRATO: Nº 021/2023, DE 15/12/2023</b> <b>VALOR CONTRATADO: R\$ 283.903,22</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇO: 28/12/2023</b> <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES</b> <b>04 MESES</b> <b>FIM DO PRAZO: 28/04/2024</b> <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 60 DIAS</b> <b>PRAZO RESTANTE: 62 DIAS</b>	<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º</b> <b>VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 57.231,09</b> <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 57.231,09</b> <b>% ACUMULADO: 20,16%</b> <b>PERÍODO: 28/12/2024 A 26/02/2024</b> <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 26/02/2024</b>
--	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.833,07</b>		<b>1.465,18</b>		<b>1.465,18</b>		<b>367,89</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	428,37	2,00	856,74	2,00	856,74	2,00	856,74	-	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	63,98	15,26	976,33	9,51	608,44	9,51	608,44	5,75	367,89
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				<b>7.007,06</b>		<b>4.219,84</b>		<b>4.219,84</b>		<b>2.787,22</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	96,02	58,00	5.569,16	35,98	3.454,46	35,98	3.454,46	22,02	2.114,70
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	24,50	58,69	1.437,90	31,24	765,38	31,24	765,38	27,45	672,52
<b>3.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>38.852,10</b>		<b>24.416,47</b>		<b>24.416,47</b>		<b>14.435,63</b>
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	723,36	2,58	1.866,26	2,28	1.649,26	2,28	1.649,26	0,30	217,00
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, JUNTAS DE 1 CM (COEF. CONF. SINAPI 73935/2 AGO/2016)	M²	93,96	22,09	2.075,57	16,36	1.537,18	16,36	1.537,18	5,73	538,39
3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3.019,92	11,56	34.910,27	7,03	21.230,03	7,03	21.230,03	4,53	13.680,24
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>				<b>70.612,22</b>		<b>17.685,06</b>		<b>17.685,06</b>		<b>52.927,16</b>
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3.019,92	16,07	48.530,11	5,52	16.669,95	5,52	16.669,95	10,55	31.860,16
4.2	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	249,61	77,29	19.292,35	-	-	-	-	77,29	19.292,35
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,60	37,10	1.691,76	13,00	592,80	13,00	592,80	24,10	1.098,96
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	60,33	18,20	1.098,00	7,00	422,31	7,00	422,31	11,20	675,69
<b>5.0</b>	<b>VEDAÇÕES</b>				<b>51.300,39</b>		<b>9.444,54</b>		<b>9.444,54</b>		<b>41.855,85</b>
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	92,37	257,39	23.775,11	96,14	8.880,45	96,14	8.880,45	161,25	14.894,66
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,97	514,78	2.558,45	113,50	564,09	113,50	564,09	401,28	1.994,36
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	48,50	514,78	24.966,83	-	-	-	-	514,78	24.966,83
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES</b>				<b>25.432,09</b>		-		-		<b>25.432,09</b>
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	51,57	90,62	4.673,27	-	-	-	-	90,62	4.673,27
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	174,62	118,88	20.758,82	-	-	-	-	118,88	20.758,82
<b>7.0</b>	<b>COBERTURAS</b>				<b>17.966,10</b>		-		-		<b>17.966,10</b>
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	97,83	77,29	7.561,28	-	-	-	-	77,29	7.561,28



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA)**

<b>OBRA:</b> REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA <b>LOCALIZAÇÃO:</b> CENTRO - MACAPARANA / PE <b>EMPRESA CONTRATADA:</b> C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA <b>RESP. TÉCNICO:</b> ENG. CIVIL GILENO DANTAS ARRUDA <b>ART DE EXECUÇÃO Nº</b> PE20241091887 <b>RRT DE FISCALIZAÇÃO Nº</b> 13995414	<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b> Nº 010/2023 <b>CONVITE:</b> Nº 003/2023 <b>CONTRATO:</b> Nº 021/2023, DE 15/12/2023 <b>VALOR CONTRATADO:</b> R\$ 283.903,22	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 28/12/2023 <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 04 MESES 04 MESES <b>FIM DO PRAZO:</b> 28/04/2024 <b>PRAZO TRANSCORRIDO:</b> 60 DIAS <b>PRAZO RESTANTE:</b> 62 DIAS	<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO:</b> 1º <b>VALOR DO 1º BOLETIM:</b> R\$ 57.231,09 <b>VALOR ACUMULADO:</b> R\$ 57.231,09 <b>% ACUMULADO:</b> 20,16% <b>PERÍODO:</b> 28/12/2024 A 26/02/2024 <b>DATA DA ELABORAÇÃO:</b> 26/02/2024
--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	72,71	77,29	5.619,75	-	-	-	-	77,29	5.619,75
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,68	24,96	1.414,73	-	-	-	-	24,96	1.414,73
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	180,09	13,56	2.442,02	-	-	-	-	13,56	2.442,02
7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	58,02	16,00	928,32	-	-	-	-	16,00	928,32
<b>8.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>23.689,71</b>						<b>23.689,71</b>
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.189,48	3,00	3.568,44	-	-	-	-	3,00	3.568,44
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.189,48	13,00	15.463,24	-	-	-	-	13,00	15.463,24
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	284,35	13,00	3.696,55	-	-	-	-	13,00	3.696,55
8.4	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	18,49	52,00	961,48	-	-	-	-	52,00	961,48
<b>9.0</b>	<b>FORRO</b>				<b>4.550,72</b>						<b>4.550,72</b>
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	50,39	90,31	4.550,72	-	-	-	-	90,31	4.550,72
<b>10.0</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>21.673,59</b>						<b>21.673,59</b>
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3,84	464,70	1.784,44	-	-	-	-	464,70	1.784,44
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	29,09	464,70	13.518,12	-	-	-	-	464,70	13.518,12
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,71	464,70	6.371,03	-	-	-	-	464,70	6.371,03
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>4.376,07</b>						<b>4.376,07</b>
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	157,37	6,00	944,22	-	-	-	-	6,00	944,22
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	130,40	2,00	260,80	-	-	-	-	2,00	260,80
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	PT	88,76	4,00	355,04	-	-	-	-	4,00	355,04
11.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	20,89	2,00	41,78	-	-	-	-	2,00	41,78
11.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	558,62	2,00	1.117,24	-	-	-	-	2,00	1.117,24
11.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	39,77	2,00	79,54	-	-	-	-	2,00	79,54
11.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	93,48	2,00	186,96	-	-	-	-	2,00	186,96
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	494,50	2,00	989,00	-	-	-	-	2,00	989,00

19



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA)**

<b>OBRA:</b> REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA <b>LOCALIZAÇÃO:</b> CENTRO - MACAPARANA / PE <b>EMPRESA CONTRATADA:</b> C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA <b>RESP. TÍC.:</b> ENG. CIVIL GILENO DANTAS ARRUDA <b>ART DE EXECUÇÃO Nº</b> PE20241091887 <b>RRT DE FISCALIZAÇÃO Nº</b> 13995414	<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b> Nº 010/2023 <b>CONVITE:</b> Nº 003/2023 <b>CONTRATO:</b> Nº 021/2023, DE 15/12/2023 <b>VALOR CONTRATADO:</b> R\$ 283.903,22	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 28/12/2023 <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 04 MESES <b>FIM DO PRAZO:</b> 28/04/2024 <b>PRAZO TRANSCORRIDO:</b> 60 DIAS <b>PRAZO RESTANTE:</b> 62 DIAS	<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO:</b> 1º <b>VALOR DO 1º BOLETIM:</b> R\$ 57.231,09 <b>VALOR ACUMULADO:</b> R\$ 57.231,09 <b>% ACUMULADO:</b> 20,16% <b>PERÍODO:</b> 28/12/2024 A 26/02/2024 <b>DATA DA ELABORAÇÃO:</b> 26/02/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	133,83	3,00	401,49					3,00	401,49
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>16.610,10</b>						<b>16.610,10</b>
12.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	M	191,02	20,00	3.820,40					20,00	3.820,40
12.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UN	160,54	14,00	2.247,56					14,00	2.247,56
12.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF. 11/2022	UN	206,68	14,00	2.893,52					14,00	2.893,52
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,53	360,00	1.630,80					360,00	1.630,80
12.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	20,92	180,00	3.765,60					180,00	3.765,60
12.6	LUMINÁRIA TIPO PAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	43,69	30,00	1.310,70					30,00	1.310,70
12.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA/DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20,94	12,00	251,28					12,00	251,28
12.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA/DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	119,80	1,00	119,80					1,00	119,80
12.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	226,94	1,00	226,94					1,00	226,94
12.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,45	30,00	343,50					30,00	343,50
				<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>283.903,22</b>	<b>TOTAL 1ª MEDIÇÃO</b>	<b>57.231,09</b>	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>57.231,09</b>	<b>TOTAL SALDO</b>	<b>226.672,13</b>

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Jalé Gomes de A. B. Andrade  
Arquiteto e Urbanista - CAUPE 139624-0  
Decor Arquitetura

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

**GILENO DANTAS ARRUDA:**  
**24769746415**

Assinado digitalmente por GILENO DANTAS ARRUDA: 24769746415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0155428500175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GILENO DANTAS ARRUDA:24769746415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.04.23 12:40:46-0500  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
 LOCALIZAÇÃO: CENTRO - MACAPARANA / PE  
 EMPRESA CONTRATADA: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 DATA: 26/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>1.1</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>					
	Placa de Obra no Padrão da Câmara dos vereadores			2,00		1,00	2,00
	<b>Total item 5.1</b>						<b>2,00</b>
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017</b>	<b>M3</b>					
	Demolição de paredes de salas existentes		1,00	13,26	0,15	2,20	4,38
			2,00	2,15	0,15	2,20	1,42
			4,00	2,00	0,15	2,20	2,64
			1,00	3,25	0,15	2,20	1,07
	<b>Total item 5.1</b>						<b>9,51</b>
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021</b>	<b>M3</b>					
	Sapatas posteriores		6,00	1,40	1,40	1,40	16,46
	Sapatas frontais		6,00	1,40	1,40	0,60	7,06
	Sapata alinhada com o prédio da câmara		1,00	1,40	1,40	0,60	1,18
	Vigas baldrame		1,00	13,26	0,60	0,35	2,78
			2,00	2,30	0,60	0,35	0,97
			4,00	2,00	0,60	0,35	1,68
	escavação alvenarias de nivelamento baldrame		1,00	13,26	0,55	0,50	3,65
			2,00	4,00	0,55	0,50	2,20
	<b>Total item 2.1</b>						<b>35,98</b>
<b>2.2</b>	<b>REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023</b>	<b>M3</b>					
	VOLUME ESCAÇÃO - ITEM 2.1		35,98				35,98
	Sapatas		-12,00	0,80	0,80	0,35	-2,69
	Vigas baldrame		-2,00	13,26	0,15	0,35	-1,39
			-2,00	2,30	0,15	0,35	-0,24
			-4,00	2,00	0,15	0,35	-0,42
	<b>Total item 2.2</b>						<b>31,24</b>
<b>3.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						
<b>3.1</b>	<b>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017</b>	<b>M3</b>					
	CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES						
	V01		1,00	13,56	0,15	0,05	0,10
	V02		1,00	13,56	0,15	0,05	0,10
	V03		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	V04		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	V05		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	V06		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	V07		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	V08		1,00	2,30	0,15	0,05	0,02
	Térreo						
	Sala 06			2,50	2,00	0,05	0,25
	Sala 07			2,50	2,00	0,05	0,25
	Sala 08			2,50	2,00	0,05	0,25
	Sala 09			2,50	2,00	0,05	0,25
	Sala 10			2,66	2,00	0,05	0,27
	Corredor			1,10	12,46	0,05	0,69
	<b>Total item 5.3</b>						<b>2,28</b>
<b>3.2</b>	<b>ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, JUNTAS DE 1 CM (COEF. CONF. SINAPI 73935/2 AGO/2016)</b>	<b>M2</b>					
	NIVELAMENTO DE VIGAS BALDRAMES						
	VB01			13,56		0,40	5,42
	VB02			13,56		0,40	5,42
	VB03			2,30		0,40	0,92
	VB04			2,30		0,40	0,92

José André  
 Arquiteto  
 C.A.U.I.P.E. A260624-8  
 Decoi Arquitetura  
 José André



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
 LOCALIZAÇÃO: CENTRO - MACAPARANA / PE  
 EMPRESA CONTRATADA: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 DATA: 26/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
		VB05		2,30		0,40	0,92
		VB06		2,30		0,40	0,92
		VB07		2,30		0,40	0,92
		VB08		2,30		0,40	0,92
	<b>Total item 3.2</b>						<b>16,36</b>
3.3	<b>COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022</b>	M3					
	SAPATAS		13,00	0,90	0,90	0,30	3,16
	Tronco de pirâmide						
	Larguras e Comprimentos das Seções iniciais e finais	L1	C1	L2	C2		
		0,90	0,90	0,30	0,45		
	$V = \frac{h}{3} \times (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2})$	Qt.	A1	A2	h		
	Volume:	13,00	0,81	0,14	0,15		0,83
	PESCOÇO PILARES						
	P01 À P07	6,00	0,30	0,20	0,55		0,20
	P08 À P13	7,00	0,30	0,20	0,90		0,38
	CONCRETO PARA VIGAS BALDRAMES						
	VB01	1,00	13,56	0,20	0,30		0,81
	VB02	1,00	13,56	0,20	0,30		0,81
	VB03	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	VB04	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	VB05	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	VB06	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	VB07	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	VB08	1,00	2,30	0,20	0,30		0,14
	<b>Total item 3.3</b>						<b>7,03</b>
4.0	<b>ESTRUTURA</b>						
4.1	<b>COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022</b>	M3					
	CONCRETO DE PILARES						
	P01 À P13 - Térreo	13,00	0,3	0,20	2,80		2,18
	CONCRETO DE VIGAS						
	V01	1,00	13,56	0,20	0,30		0,81
	V02	1,00	13,56	0,20	0,30		0,81
	V03	1,00	13,36	0,20	0,30		0,80
	V04	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	V05	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	V06	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	V07	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	V08	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	V09	1,00	1,4	0,20	0,30		0,08
	V10	1,00	2,3	0,20	0,30		0,14
	<b>Total item 4.1</b>						<b>5,52</b>
4.3	<b>VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016</b>	M					
	PORTAS (P1)						
	sala 6	1,00	1,20				1,20
	sala 7	1,00	1,20				1,20
	sala 8	1,00	1,20				1,20
	sala 9	1,00	1,20				1,20
	sala 10	1,00	1,20				1,20
	JANELA (J1)						
	sala 6	1,00	1,40				1,40
	sala 7	1,00	1,40				1,40
	sala 8	1,00	1,40				1,40
	sala 9	1,00	1,40				1,40
	sala 10	1,00	1,40				1,40
	<b>Total item 4.3</b>						<b>13,00</b>

Jaime Gomes de A. S. Andrade  
 Arquiteta e Urbanista CAUIPE A260624-e  
 Decor Arquitetura

*J. Andrade*



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
 LOCALIZAÇÃO: CENTRO - MACAPARANA / PE  
 EMPRESA CONTRATADA: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 DATA: 26/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M					
	JANELA (J1)						
	sala 6		1,00	1,40			1,40
	sala 7		1,00	1,40			1,40
	sala 8		1,00	1,40			1,40
	sala 9		1,00	1,40			1,40
	sala 10		1,00	1,40			1,40
	<b>Total item 4.4</b>						<b>7,00</b>
5.0	VEDAÇÕES						
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					
	Térreo						
	Sala 06		2,00	2,00	2,80		11,20
	Descotas		2,00	2,80	2,80		15,68
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 07		1,00	2,00	2,80		5,60
	Descotas		2,00	2,65	2,80		14,84
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 08		1,00	2,00	2,80		5,60
	Descotas		2,00	2,65	2,80		14,84
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 09		1,00	2,00	2,80		5,60
	Descotas		2,00	2,65	2,80		14,84
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 10		1,00	2,00	2,80		5,60
	Descotas		2,00	2,81	2,80		15,74
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	<b>Total item 5.1</b>						<b>96,14</b>
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					
	Térreo						
	Sala 06			9,00	2,80		25,20
	Descotas						
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 07			9,00	2,80		25,20
	Descotas						
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00
	Sala 08			9,00	2,80		25,20
	Descotas						
	Porta		-1,00	0,80	2,10		-1,68
	Janela		-1,00	1,00	1,00		-1,00

Valde Farias de A. B. Andrade  
 Arquiteta e Urbanista - CAUIPE A260024-E  
 Deco - Arquitetura

*Valde Farias de A. B. Andrade*



**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
LOCALIZAÇÃO: CENTRO - MACAPARANA / PE  
EMPRESA CONTRATADA: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
DATA: 26/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Sala 09			9,00		2,80	25,20
	Descontos						
	Porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Janela		-1,00	1,00		1,00	-1,00
	Sala 10			9,32		2,80	26,10
	Descontos						
	Porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Janela		-1,00	1,00		1,00	-1,00
	<b>Total item 5.2</b>						<b>113,50</b>

*gileno dantas*  
Jáleno Dantas de A. B. Arruda  
Inscrição Profissional: CAUPE 62043-1  
Bairro: Arruda

**GILENO DANTAS**  
**ARRUDA:**  
**24769746415**

Assinado digitalmente por GILENO DANTAS  
ARRUDA:24769746415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=0155428500175, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(em branco), CN=GILENO DANTAS ARRUDA:  
24769746415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.04.23 12:46:54-03'00  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



## DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01

**OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**LOCALIDADE: CENTRO - MACAPARANA / PE**

**DATA: 26/02/2024**



Foto 01: Escavação manual de valas



Foto 02: concretagem de viga baldra, alvenaria de embasamento de 1 vez, concretagem de pescoço de pilares



Foto 03: Placa de obra do padrão da câmara municipal de Macaparana-PE.



Foto 04: Alvenaria de vedação.



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01**

**OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**LOCALIDADE: CENTRO - MACAPARANA / PE**

**DATA: 26/02/2024**



Foto 05: Caixaaria para concretagem de sapatas.



Foto 06: Vigas superiores concretadas.



Foto 07: Vergas e contravergas aplicadas em vãos de portas e janelas.



Foto 08: Lastro de concreto magro aplicado em ambientes internos as salas, chapisco aplicado em alvenarias.



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01**

**OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**LOCALIDADE: CENTRO - MACAPARANA / PE**

**DATA: 26/02/2024**



Foto 01: Escavação manual de valas



Foto 02: concretagem de viga baldra, alvenaria de embasamento de 1 vez, concretagem de pescoço de pilares



Foto 03: Placa de obra do padrão da câmara municipal de Macaparana-PE.



Foto 04: Alvenaria de vedação.

*Jaime B. Andrade*  
Jaime B. Andrade  
Arquiteta e Urbanista CAUIPE A2606244  
Decor Arquitetura



**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01**

**OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**LOCALIDADE: CENTRO - MACAPARANA / PE**

**DATA: 26/02/2024**



Foto 05: Caixaria para concretagem de sapatas.



Foto 06: Vigas superiores concretadas.

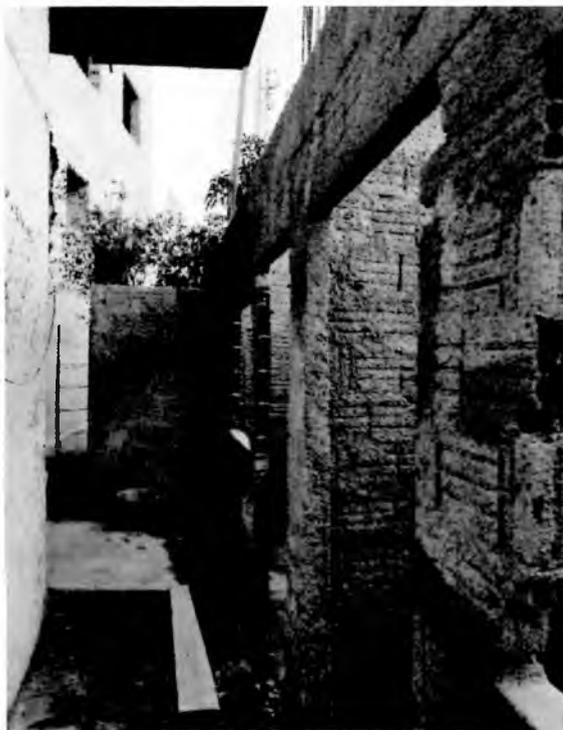


Foto 07: Vergas e contravergas aplicadas em vãos de portas e janelas.



Foto 08: Lastro de concreto magro aplicado em ambientes internos as salas, chapisco aplicado em alvenarias.

	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA</b> AV JOAO FRANCISCO 11.287.893/0001-14	<b>Nota de Subempenho</b>  <b>0125/0001</b>
--	--	---

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 4110	<b>Nome do Fornecedor</b> C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>Telefone</b> (81) 3525-1533
<b>Endereço</b> R ALCANTARA 238 CENTRO	<b>Cidade</b> SAO LOURENCO DA MATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 17.331.335/0001-95	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>
<b>Conta</b>		

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DO PROJETO BÁSICO, ANEXO AO PROCESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO "MENOR PREÇO" GLOBAL.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>57.231,09</b>
--	--



<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>	<b>Ficha: 8009</b>
01 01 01 00 4.4.90.51.99 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL - CORPO DELIBERATIVO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>FONTE</b>	01 TESOURO	Recursos Ordinarios

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> EX - Extra orçamento	<b>Data da Emissão</b> 26/02/2024	<b>Vencimento</b> 20/04/2024	<b>Saldo Anterior:</b>	283.903,22
<b>Licitação (modalidade)</b> OBRA CONVITE	<b>Nº da Licitação</b> 000010/23	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	57.231,09
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Liquidado até a data:</b>	283.903,22
			<b>Saldo Atual:</b>	0,00

<b>Descontos:</b> ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CM 1.144,62 IRRF - PRESTADOR 686,77 INSS - PRESTADOR 2.518,18	<b>Valor Liquido R\$:</b>  <b>52.881,52</b>
---	---

**VALOR A SER PAGO R\$** **52.881,52**  
 cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>IVAN LUIZ</b> <b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Ordenador de Despesa</b> 	<b>Atesto:</b> <b>Material/Serviço</b>
<b>Autorizo o Pagamento</b> 	<b>Responsável</b> 	<b>Pago em:</b> 27/02/2024 <b>Recurso:</b> <b>Ordem / Cheque :</b>
Macaparana-Pe, _____ de _____ de _____ <b>Assinatura Credor</b>	<b>Documento Identificação</b>	 <b>Liquidado</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00001225

Competência:

FEV/2024

Data e Hora Emissão:

27/02/2024 15:39:17

Código de Verificação:

Y4WE-XV2UJ

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

**EXIGÍVEL**

Número do RPS:

Regime de Tributação:

**NORMAL**

Série do RPS:

Município de Incidência do ISS:

**SÃO LOURENÇO DA MATA - PE**

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:

**SÃO LOURENÇO DA MATA - PE**

ISS Retido:

**SIM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**17.331.335/0001-95**

Nome/Razão Social:

**C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME**

Endereço:

**DOCTOR FRANCISCO CORREA ,CENTRO. 433 EDIF EG APT 302 SL C**

Município:

UF:

CEP: **54735000**

E-mail:

TEL:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**11.287.893/0001-14**

Inscrição Municipal:

---

Inscrição Estadual:

---

Nome/Razão Social:

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Endereço:

**AVENIDA JOAO FRANCISCO, 110 CENTRO**

Município:

**MACAPARANA**UF: **PE**CEP: **55865000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.SERVICO DE CONSTRUCAO E REFORMA #QTD:1 - V.UKD.:R\$57.231,09 - TOTAL.:R\$57.231,09 - DED.:R\$34.338,65

NOTA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA CONFORME ALIJAMENTO CONSTANTE NO PROJETO BASICO ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO 010/2023, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL CONVITE N 003/2023 E CONTRATO N 021/2023. REGISTRO DE OBRA ATRAVES DO CNO N 90.018.17809/76. MAO DE OBRA 40% MATERIAL 60%

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.231,09**

Atividade Prestada:

**4299599 -**

Código CNAE:

**4299599****702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
53.568,29	34.338,65	22.892,44	5,00%	1.144,62
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2.518,18	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES5**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.  
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612712679212593

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



## Emissão de comprovantes

G3382409313850661  
24/04/2024 09:36:3627/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:05  
225702257 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA M DE MACAPARANA  
AGENCIA: 2257-8 CONTA: 70.355-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2024

NR. DOCUMENTO 611.138.000.042.412

VALOR TOTAL 52.881,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C M C P S LTDA  
AGENCIA: 1138-X CONTA: 42.412-9

NR. DOCUMENTO 612.257.000.070.355

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FD4.6F5.7A0.DA8.296

Transação efetuada com sucesso por: J9025264 IVAN LUIZ DE FRANCA JUNIOR.
